



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
UNITE - DIGNITE – TRAVAIL

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

DIRECTION DE CABINET

UNITE DE GESTION DU PROJET DE CAPITAL HUMAIN ET
D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES « MAÏNGO »




PROJET DE CAPITAL HUMAIN ET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES « MAÏNGO »

Financement :

DON IDA

RAPPORT D'AVANCEMENT DU PROJET

(01 Janvier-31 Décembre 2023)

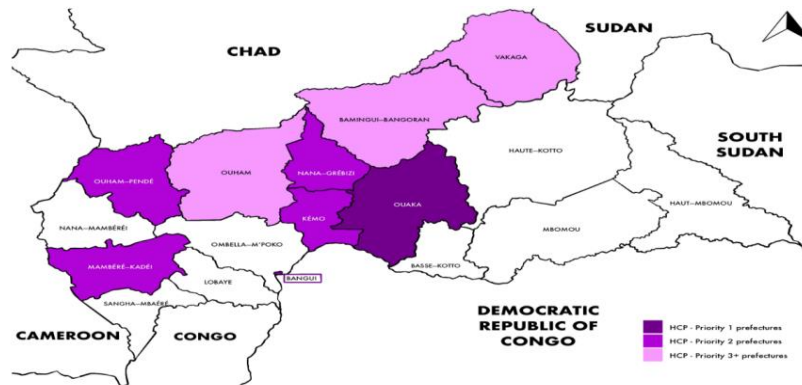

Date de publication : Décembre 2023

DRAFT 00

Unité de Gestion de Projet Maïngo
Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Rue Martin Luther King,
BP : 696, République Centrafricaine
Tél. (+236) 70 80 97 11/ 75 80 97 11/ 72 58 91 06
Email : pounebingui@yahoo.fr ; irenesabendo66@gmail.com

SOMMAIRE :

I.	IDENTIFICATION	3
II.	PRESENTATION DU PROJET	4
	2.1. Contexte et justification du projet	4
	2.2. Description du projet	4
	2.2.1 Rappel des objectifs du projet	4
	2.2.2. Composantes du projet	5
	2.2.3 Financement et durée du projet.....	5
III.	ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PROJET	6
	3.1 Etat d'avancement par composante	6
	3.2 Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités	17
	3.3 Rapport sur les sauvegardes environnementales et sociales/violences basées sur le genre (VBG/EAS et HS).	20
	3.4 Suivi des activités	21
IV.	ETAT D'EXECUTION FINANCIERE	22
	3.1. Rappel du programme d'activités (PTBA 2023)	22
	3.2. Exécution financière du projet au 31 décembre 2023.....	23
V.	PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET SOLUTIONS	25
VI.	CONCLUSION ET PERSPECTIVES	25
	ANNEXES	26
	Annexe 1 : Plan de Travail Annuel 2024	27
	Annexe 2 : Cadre de suivi des indicateurs des résultats du projet Maïngo actualisé au 31 décembre 2023.....	27
	Annexe 3 : Cadre de suivi des indicateurs intermédiaires actualisé au 31 décembre 2023	28

I. IDENTIFICATION

N° Identification du Projet : P171158		Zones du projet
N° accord de crédit : Don numéro 8590-CF		
Montant crédit : 50 millions de \$ US répartie comme suit : (i) Composante 1 : Création d'espaces sûrs ciblant les femmes et les adolescentes en leur offrant des services intégrés à base communautaire US\$ 22 millions (ii) Composante 2 : Renforcement de l'accès aux systèmes afin d'améliorer la santé, l'éducation, les connaissances et les opportunités économiques pour les femmes et les adolescentes US\$ 21 millions (iii) Composante 3 : Renforcement des capacités nationales et campagnes de communication pour l'autonomisation des femmes et des filles et la gestion de projet US\$ 7 millions (iv) Composante 4 : Intervention d'urgence Conditionnelle en US\$ 0		1. Grand-Bangui 2. Kémo 3. Nana-Grébizi 4. Ouaka
Approbation du Projet : 23 juin 2021	Maître d'ouvrage : Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale	
Accord de DON IDA : 27 septembre 2021	Contact du projet : Madame Irène SABENDO, Coordonnateur du projet Maïngo Tel. 75 80 97 11/ 72 58 91 06 E-mail : irenesabendo66@gmail.com	
Mise en vigueur : 15 février 2022	Agence d'exécution du projet : Unité de Gestion du Projet Maïngo	
Durée exécution : 5 ans		
Date de clôture prévue : 31 décembre 2026	Ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet : <ul style="list-style-type: none"> - Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale - Ministère de la Santé et de la Population - Ministère de l'Education (MEPS) - Ministère de l'Enseignement Technique et de l'Alphabétisation - Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant - MTEPSFP via l'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l'Emploi (ACFPE) - Ministère de la Jeunesse et des Sports - Ministère de l'Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale 	
Principaux Bénéficiaires : Les filles et les jeunes femmes âgées de 10 à 24 ans.		
Bénéficiaires secondaires : Les jeunes hommes, ainsi que toutes les femmes en âge de procréer et leurs enfants		
Chargé de Projet (TTL): Abdoulaye Ka		

II. PRESENTATION DU PROJET

2.1. Contexte et justification du projet

La République Centrafricaine (RCA) a traversé une période de conflits récurrents et de volatilité politique qui ont plongé les populations dans l'extrême pauvreté et impacté les systèmes de services sociaux de base. Les années de conflit et l'insuffisance de services sociaux de base essentiels pour le développement humain ont abouti à de faibles résultats en matière de capital humain et créé d'énormes besoins à travers tout le pays. L'indice du capital humain de la RCA pour 2020 est l'un des plus bas au monde. Or, l'autonomisation des femmes et des filles est au cœur de la formation du capital humain et représente un point d'entrée essentiel pour le développement du capital humain sur l'ensemble du pays.

C'est dans cette optique que le Gouvernement de la République Centrafricaine a sollicité et obtenu l'appui de la Banque Mondiale pour mettre en œuvre le « **Projet Capital Humain, Autonomisation des Femmes et des Filles dénommées en langue sango « Maïngo »** ».

2.2. Description du projet

2.2.1 Rappel des objectifs du projet

- Objectif de développement et indicateurs principaux du projet

L'objectif de développement est d'améliorer l'accès aux services de santé essentiels, à l'éducation et aux opportunités d'emploi qui autonomisent les femmes et les adolescentes dans les zones ciblées de la République Centrafricaine.

Pour atteindre cet objectif, le projet va :

Les indicateurs au niveau des ODP sont :

- ENVIRONNEMENT FAVORABLE : Changement d'attitude positif en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles parmi les jeunes (pourcentage) ;
- AMÉLIORER : nouveaux utilisateurs d'une méthode contraceptive moderne (nombre) ;
- ÉDUIQUER : indice de parité entre les sexes en première année du premier cycle du secondaire (pourcentage) ;
- EMPLOYER : part des jeunes femmes ayant une activité économique¹réelle à la fin du soutien de post-crédation (pourcentage).

Pour atteindre les ODP et les indicateurs visés ci-dessus, les activités du projet ont été regroupées en quatre (04) composantes, à savoir :

¹Une activité économique « active » est définie comme une activité qui a généré des revenus supérieurs à un seuil minimum sur une certaine période. Le seuil et la période appropriée seront déterminés pendant la mise en œuvre sur la base des conclusions de l'évaluation locale.

2.2.2. Composantes du projet

Le projet s'articule autour de 4 composantes et de 6 sous-composantes comme le présente le tableau ci-dessous :

C1. Établir des espaces surs et des clubs pour offrir des programmes **communautaires** intégrés (IDA : **US\$ 22 millions**)

C2. Accroître l'accès aux **systèmes** qui améliorent la santé, l'éducation et les opportunités d'emploi des femmes et des filles (IDA : **US\$ 21 millions**)

- 1.1 Élargir l'accès au système de santé grâce aux ASC.
- 1.2 Accueillir et garder les filles dans le système éducatif.
- 1.3 Formation professionnelle et opportunités économiques pour les jeunes non scolarisés, dans les CEFPA.


C3. Renforcement des capacités **nationales** et des campagnes de communication pour l'autonomisation des femmes et des filles (IDA : **US\$ 07 millions**)

- 3.1 Renforcement des capacités nationales pour coordonner et planifier les investissements en capital humain.
- 3.2 Campagnes de communications nationales pour l'autonomisation des femmes et des filles.
- 3.3 Gestion, supervision, suivi et évaluation (S&E) du projet.

2.2.3 Financement et durée du projet

Le projet bénéficie d'une allocation sous forme de Dons de l'IDA équivalant à 50 millions de dollars US. Il a une durée de vie de 5 ans et demie commençant en 2022 et se terminant 2026.

Figure 1 : Répartition de coût du projet par composante en pourcentage

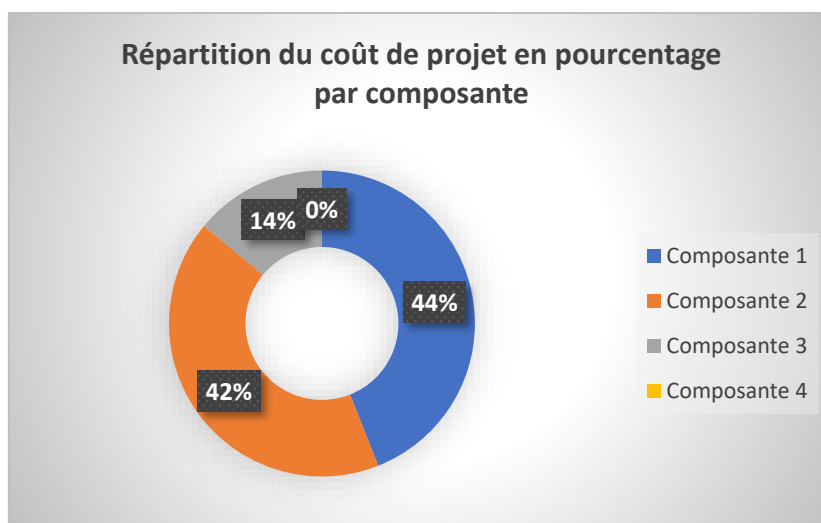

III. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PROJET

L'examen de l'état d'exécution physique du projet est analysé au regard des tableaux de l'avancement des activités par composante, du suivi du plan de passation des marchés, des mesures de sauvegarde environnementale et sociale/VBG-EAS-HS/Sécurité d'une part, et le cadre de suivi des résultats d'autre part.

3.1 Etat d'avancement par composante

Au 31 décembre 2023, l'état d'avancement des activités par composante est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Etat d'avancement des activités du projet au 31 décembre 2023

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
COMPOSANTE 1: Création des espaces Sûrs ciblant les femmes et les adolescentes en leur offrant des services intégrés à base communautaire						
1	Etude qualitative	Montant : 34 985 000 Durée : mois	Bureau d'Etudes La Générale des Services "LGS 2050 SARL	Rapport définitif de qualitative disponible	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	Activité clôturée
2	Recrutement de l'ONG/Espaces Sûrs et Clubs	Montant : 2 491 390 650 Durée : 16 mois	CPADES/KODE TI KWA	- Rapport démarrage produit - 2 ONG partenaires de mise en œuvre recrutées - 16 Facilitateurs et 8 Superviseurs recrutés - Mission d'appui à l'identification des ESC réalisée - Processus du recrutement des mentors lancé	- Taux d'exécution physique: 20% - Taux d'exécution financière: 20%	- Mission d'appui à l'identification des mentors dans les 4 zones du projet programmée pour janvier 2024 - Les premiers ESC seront livrés mi-février 2024
3	Recrutement de la deuxième ONG/ Espaces Sûrs et Clubs	Montant : Durée :		-Tdrs finalisé - AMI lancé	- Taux d'exécution physique: 20% - Taux d'exécution financière: 0%	Le retard dans le recrutement de la 2nde ONG risque d'impacter négativement sur le délai d'exécution de la phase 1 du projet
COMPOSANTE 2: Accroître l'accès aux systèmes qui améliorent la santé, l'éducation et les opportunités d'emploi des femmes et des filles						
Sous composante 2.1: Elargir l'accès au système de santé grâce aux ASC						
Volet 1. Renforcer la gouvernance des interventions en matière de santé communautaire						
Activité : Contribuer à l'élaboration des documents normatifs du secteur santé communautaire						

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
4	Politique nationale de santé communautaire : forum national de parties prenantes, atelier d'élaboration et de validation			- Politique nationale de Santé Communautaire élaborée - Forum national organisé - Atelier de validation organisé	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	Activité clôturée
5	Atelier technique de rédaction de la stratégie niveau gouvernement			Atelier technique de rédaction de la stratégie de l'engagement communautaire organisé	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	Activité clôturée
6	Atelier de validation de la stratégie avec les partenaires			Atelier validation de la stratégie de l'engagement communautaire organisé	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	Activité clôturée
7	Atelier de dissémination de la stratégie de la santé communautaire			Activité non réalisée		En attente de la signature du document par le Chef de l'Etat
8	Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de la politique nationale de la Santé Scolaire			Activité non réalisée car elle a été déjà prise en compte par le Projet SENI+		Activité pour le compte du Projet SENI +
9	Atelier de rédaction de la politique nationale de la santé scolaire			Activité non réalisée car elle a été déjà prise en compte par le Projet SENI+		Activité pour le compte du Projet SENI +
10	Atelier de validation de la politique nationale de la santé scolaire			Activité non réalisée car elle a été déjà prise en compte par le Projet SENI+		Activité pour le compte du Projet SENI +
11	Atelier de dissémination de la politique de santé scolaire			Activité non réalisée car elle a été déjà prise en compte par le Projet SENI+		Activité pour le compte du Projet SENI +

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
Volet 2 : Accroître l'offre et la demande des prestations essentielles de la santé au niveau communautaire						
Activité : Appuyer l'exécution des activités de santé communautaire dans les zones du projet						
12	Relecture de la politique nationale de la santé communautaire			Activité reprogrammée pour 2024		Activité reprogrammée pour 2024
13	Sensibilisation du personnel de santé dans les zones du projet			Activité reprogrammée pour 2024		Activité reprogrammée pour 2024
14	Appui en l'organisation de réunions de dialogue communautaire par les districts sanitaires dans la région sanitaire 4 (Ouaka, Kémo et Nana Grébizi) et Bimbo, nombre des communes dans la zone d'intervention du projet avec l'implication des Autorités politico administratives de chaque commune à raison de 24 réunions par trimestre. Les experts en sauvegarde sociale et environnementale vont donner un appui technique dans la mise en œuvre de cette activité en lien avec le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)			Activité reprogrammée 2024		Le Guide de mise en œuvre de ces différents organes a été validé en Décembre 2023

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
15	Identification et formation des ASC sur les pratiques familiales essentielles et autres activités de routine dans la zone 1 du Projet			- Tdrs élaborés - Activité réalisée à Bimbo - Identification des ASC en cours	- Taux d'exécution physique: 20% - Taux d'exécution financière: 0%	- Processus entamé à Bimbo avec la cartographie des sites - Attente de la liste des ASC retenus
16	Achat des équipements des ASC dans les Districts Sanitaires de Bimbo, Kemo, Nana-Gribizi, Ouaka de la zone du projet (sac à dos, gilet, registre, thermomètre, imperméable, mégaphones, Bande tricolore MUAC, botte,)	Montant : 32 722 000 Date signature contrat : Durée : mois		Activité réalisée	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 80%	Equipements des ASC livrés
17	Achat des médicaments des Agents de santé communautaire (ASC) pour la PCIME Communautaire dans la phase 1 (SRO, zinc, Amoxicilline, paracétamol, coartem, fer) et Abendazole	Montant : 188 810 000 Durée : mois	Global Pharma	Activité partiellement car Abendazole a été acquis	- Taux d'exécution physique pour Abendazole: 100% - Taux d'exécution financière: 50%	Livraison en cours
18	Achat des serviettes hygiéniques pour la gestion des lochies chez les femmes en âge de procréer dans les communautés	Montant : 97 750 000 Durée : mois	Etablissement Peace Enjoy	Achat des serviettes hygiéniques en cours d'acquisition	- Taux d'exécution physique: 50% - Taux d'exécution financière: 0%	En attente de la livraison par le fournisseur
19	Acquisition des kits de dignité pour les filles	Montant : 35 910 000 Durée : mois	YANG MULTI SERVICES	Activité réalisée	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	Marché clôturé

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
Activité : Appuyer la mise en œuvre des interventions à haut impact sur la Santé maternelle et infantile au niveau communautaire						
20	Appuyer l'organisation de deux campagnes de suppléments de vitamine A et de déparasitage à l'albendazole dans les districts sanitaires de Bimbo, Kemo, Nana-Gribizi, Grimlari-Kouango et Bambari)			Activité reprogrammée pour 2024		- Les ressources budgétées ne sont pas suffisantes pour organisées 2 campagnes - Une seule campagne sera réalisée en février 2024
21	Organiser la campagne de distribution de moustiquaires imprégnées et de kits de dignité dans les districts sanitaires de Bimbo, Kemo, Nana-Gribizi, Grimlari-Kouango et Bambari)			Activité reprogrammée pour 2024		- La campagne sera réalisée en juin 2024
Sous composante 2.2: Accueillir et garder les filles dans le système éducatif						
Sous composante 2.2.a: Programme Rendre l'Ecole Accessible aux Filles						
Activité 1 : Accompagnement technique pour la mise en place des COGEDES/AME et l'appui aux subventions						
22	Recrutement d'une ONG pour la mise œuvre de la sous composante 2,2	Montant : 70 350 000 Date signature contrat : Durée :	CCEB-BF	Activité réalisée	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	ONG CCEB-BF en charge de l'accompagnement est en fin contrat

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
23	Missions de mise en place des comités techniques d'identification des bénéficiaires des redevances scolaires et d'identification des COGEDES/AME des écoles primaires PUSEB/PAPSEII dans les 4 préfectures (IA)			- 25 COGEDES mis en place dont 15 au niveau F1 et 10 F2 dans Grand Bangui - 10 AME mis en place dont 10 au niveau F1 et 10 F2 Grand Bangui		Mission dans la kémo, Nana Grébizi et Ouaka prévue pour janvier 2024
Sous composante 2.2.b: Programme Rendre l'Ecole Amie des Filles						
24	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude visant à analyser la collecte et l'utilisation des redevances scolaires aux cycle primaire dans les préfectures de Grand Bangui, Kemo - Nana Gribizi et Ouaka (solde)	Montant : 15 750 000 Durée :	NAM Gisèle	- Consultant recruté - Etude réalisée - Rapport de l'étude disponible	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	Activité clôturée
25	Mission d'information sur la scolarisation des filles dans les 4 préfectures					
Activité 3 : Phase de mise en œuvre						
26	Octroi de bourses d'études pour les filles et garçons au secondaire			Activité en cours		Les bourses d'études seront octroyées aux élèves dès mars 2024
27	Octroi de subventions aux AMEs/COGEDES et autres structures éducatives/écoles primaires			Activité en cours		Les subventions seront octroyées aux COGEDES/AME dès mars 2024

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
28	Octroi de subventions aux écoles secondaires dans les 4 zones			Activité en cours		Les bourses d'études seront octroyées aux écoles secondaires dès mars 2024
29	Discussions sur le genre dans les écoles secondaires dans les 4 zones			Activité reprogrammée en 2024		
30	Suivi de la mise en œuvre des activités dans les espaces sûrs scolaires dans les lycées et collèges de PUSEB et PAPSE II			Activité reprogrammée en 2024		
31	Acquisition et dotation des filles en kits de dignité			Activité en cours		
Sous composante 2.3: Formation professionnelle et opportunités économiques pour les jeunes non scolarisés dans les CFPA						
32	Recrutement du consultant national pour la mise à jour des curricula de la formation en alphabétisation	Montant : Durée :		- Tdrs du recrutement élaborés - Evaluation des propositions - AMI lancé en février 2023 - Processus de recrutement en cours	- Taux d'exécution physique: 10% - Taux d'exécution financière: 0%	Processus de recrutement en cours
33	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour des études techniques des infrastructures à réhabiliter dans les six (06) Centres de Formation Professionnelle et d'alphabétisation (CFPA)	Montant : Date signature contrat : 12/06/2023 Durée :	Groupement LUSTRE-ARCI/ATE-LIER 3 A	- Etat des lieux de six (6) sites CFPA réalisés -APS disponible - APD en cours	- Taux d'exécution physique: 40% - Taux d'exécution financière: 0%	- Livrables 1 APS disponible - Livrable 2 APD en cours - Elaboration de DAO d'ici premier trimestre 2024 - Mission en cours d'exécution

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
COMPOSANTE 3: Renforcement des capacités nationales et des campagnes de communication pour l'autonomisation des femmes et des filles						
Sous composante 3.1: Renforcement des capacités nationales pour coordonner et planifier les investissements en capital humain						
34	Recrutement d'un Consultant pour la conceptualisation de l'observatoire national du capital humain (ONCH)	Montant : Durée :		- Tdrs du recrutement élaborés - Evaluation des propositions - PV Négociation et projet de contrat partagés à la Banque pour avis le 14 décembre 2023	- Taux d'exécution physique: 20% - Taux d'exécution financière: 0%	- Le contrat avec le consultant pourrait être signé au mois janvier 2024
35	Élaboration d'un plan de renforcement des capacités pour les ministères et l'UGP	Montant : 24 811 250 Durée : mois		Activité clôturée	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	
Sous composante 3.2: Campagnes de communication nationale pour l'autonomisation des femmes et des filles						
36	Elaboration de la stratégie de Communication pour le Changement Social et de comportement du projet Maïngo	Montant : 65 525 880 Durée : mois	Cabinet KOLINGO	- Cabinet a été recruté - Comité technique mis en place pour encadrer le processus - Rapport d'analyse situationnelle finalisé - Stratégie de Communication finalisée et en attente de validation	- Taux d'exécution physique: 90% - Taux d'exécution financière: 90%	- Validation nationale de la SCCSC prévue pour 2024
37	Séance d'échanges sur le projet avec les professionnels des média, les acteurs d'influence et les représentants des ONGs locales	Montant : Durée :		Activité clôturée	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
38	Campagne de communication autour du lancement des programmes « Rendre l'école accessible aux filles » et « Rendre l'école Amie des filles »			Plan de communication élaboré et envoyé à la BM pour avis	- Taux d'exécution physique: 100% - Taux d'exécution financière: 100%	
39	Campagne radio autour du déploiement des activités des ASC			Tdrs en cours d'élaboration	- Taux d'exécution physique: 0% - Taux d'exécution financière: 0%	
40	Appui à la campagne de sensibilisation sur le lancement des espaces sûrs			Tdrs en cours d'élaboration	- Taux d'exécution physique: 0% - Taux d'exécution financière: 0%	
41	Opérationnalisation du plan de communication pour le changement social et de comportement			En attente de la validation de la stratégie et du plan de mise en œuvre	- Taux d'exécution physique: 0% - Taux d'exécution financière: 0%	
Sous composante 3.3: Gestion, supervision, suivi et évaluation (S&E) du projet						
42	Recrutement d'un cabinet de recherche pour l'évaluation d'impact	Montant : Durée :		-Tdrs du recrutement élaborés - Sélection du Cabinet NORC - Négociation relative avec NORC n'a pas aboutie	- Taux d'exécution physique: 10% - Taux d'exécution financière: 0%	- Second cabinet sur la liste GECA Prospective a été contacté pour une proposition financière
43	Atelier de renforcement de capacités des points focaux en Kobocollect			-Tdrs de l'atelier de renforcement des capacités élaborés et disponibles	- Taux d'exécution physique: 10% - Taux d'exécution financière: 0%	- Formation programmée pour 2024

N°	Description des activités	Montant et durée du marché	Entreprises	Avancement au 31 décembre 2023	Taux d'exécution physique et financière au 31 décembre 2023	Observations/commentaires
44	Elaboration du plan de suivi-évaluation			- Plan de Suivi-Evaluation en cours d'élaboration - Tdrs de la réunion technique avec les acteurs clés des composantes élaborés	- Taux d'exécution physique: 10% - Taux d'exécution financière: 0%	- Plan de suivi-évaluation est tributaire de la réunion technique avec les acteurs clés des composantes
45	Recrutement Experts UGP (Expert en Suivi-évaluation et Santé Communautaire)			Activité clôturée	- Taux d'exécution physique: 100%	Les experts sont opérationnels depuis juin et juillet 2023

3.2 Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités

Le plan de passation des marchés (PPM) validé par la Banque a été approuvé en février 2022 par le Comité de Pilotage. Les 23 Marchés prévus au PTBA 2023 réparti comme suit :

- 11 marchés de services de consultants ;
- 10 marchés de fournitures et biens ;
- 2 marché des travaux.

Sur les 23 marchés inscrits, six (6) marchés de services de consultants, trois (03) marchés de fournitures et biens ont abouti à la signature des contrats. Le tableau ci-après présente l'état d'avancement de la passation des marchés couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023

Tableau 5: Mise en œuvre du PTBA 2023 en termes de Passation des Marchés au 31 décembre 2023

N°	Référence et objet du marché	Coût du marché/contrat en XAF	Titulaire du marché	Mode de passation / méthode de sélection	Date de signature du contrat	Durée du contrat/marché	Niveau d'exécution du contrat au 31/12/2023
SERVICES DE CONSULTANTS							
1	Recrutement d'un Cabinet/Bureau d'Etudes d'Expertise Comptable pour l'audit financier et comptable du Projet MAÏNGO au titre des exercices 2021, 2022 et 2023	11 898 500	Cabinet BS& CO Consulting		05/05/2023	???	Marché en cours
2	Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) chargée d'accompagner la mise en œuvre de la sous-composante 2.2 « Soutenir la scolarité des filles aux cycles primaire et secondaire »	70 350 000	ONG CCEB-BF		30/05/2023	???	- Marché sera clôturé en juin 2024
3	Recrutement d'un Cabinet chargé de l'élaboration de la stratégie de communication autour de la mise en œuvre des activités du Projet Capital Humain, Autonomisation des Femmes et des Filles	65 525 880	Consortium KOLINGO COMMUNICATION ET MARKETING Surl et MUNA SPHERE Sarl		22/05/2023	???	- Marché en retard par rapport au calendrier d'exécution - Un avenant a été signé le..... pour un délai supplémentaire de - Nouvelle date de fin du contrat le..... - Au 31/12/2023, le marché n'est pas encore clôturé
4	Recrutement d'un consultant pour une mission technique des infrastructures à réhabiliter dans les six (06) CFPA	141 629 900	Groupement LUSTRE ARCI et ATELIER A3 Sarl		12/06/2023	???	- Marché en retard par rapport au calendrier d'exécution - Un avenant a été signé le..... pour un délai supplémentaire de

N°	Référence et objet du marché	Coût du marché/contrat en XAF	Titulaire du marché	Mode de passation / méthode de sélection	Date de signature du contrat	Durée du contrat/marché	Niveau d'exécution du contrat au 31/12/2023
							- Nouvelle date de fin du contrat le..... - Au 31/12/2023, le marché n'est pas encore clôturé
5	Recrutement d'un consultant (ONG) chargé de la mise en œuvre des activités des espaces sûrs pour les jeunes femmes et clubs pour les jeunes hommes du projet « Maïngo »	2 491 390 650	ONG CPADES/KODE TI KWA		27/09/2023	16 mois	Contrat en cours - Rapport de démarrage soumis
MARCHES DE FOURNITURES & BIENS							
6	Acquisition de kits de dignité pour les filles	35 910 000	YANG MULTI-SERVICES		30/10/2023	???	Marché clôturé
7	Acquisition de médicaments pour les communautés et l'albendazole pour la campagne	188 810 000	Société GLOBAL PHARMA		12/12/2023	???	Livraison en cours
8	Achat de serviettes hygiéniques pour les filles en milieu scolaire et la gestion de lochies chez les femmes dans les communautés avec l'Etablissement	97 750 000	PEACE & JOY		12/12/2023	???	Contrat en cours. - Serviettes hygiéniques sont en attente de livraison
TRAVAUX							

NB : L'Unité de Gestion de Projet Maïngo a été renforcée par 5 experts. Les contrats de consultance individuelle suivants ont été signés au cours de l'année 2023.

- 1- Spécialiste en Sécurité/ contrat signé le 06/03/2023
- 2- Comptable/contrat signé le 06/03/2023
- 3- Spécialiste en suivi-évaluation/contrat signé le 01/06/2023
- 4- Spécialiste en santé communautaire/contrat signé le 01/07/2023

3.3 Rapport sur les sauvegardes environnementales et sociales/violences basées sur le genre (VBG/EAS et HS).

Le présent rapport décrit les activités de sauvegardes environnementale et sociale et des violences basées sur le genre réalisé sur la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023.

3.3.1. Aspects de sauvegardes environnementales et sociales

Les activités de sauvegardes environnementales et sociales au 31 décembre 2023 concernent les zones de la première phase 1 du projet à savoir : Grand Bangui, Kémo, Nana Grébizi et Ouaka. Les activités réalisées sont les suivantes :

N°	Activités planifiées en 2023	Réalisations au 31/12/ 2023	Perspectives
1	Identification du site et préparation des document de sauvegarde des 6 CFPA	- Trois (6) screening ont été réalisés ; - Trois (3) rapports validés (Bangui, Sibut, Bambari); - Deux (2) rapports screening envoyés à la banque (Berberati ; site de l'UGP) ; le rapport de Bossangoa en attente des conclusions de l'APS; - Tdrs de réalisation de screening de Bozoum envoyé à la Banque pour avis	Elaboration des documents retenus
2	Préparation du PGES du site de Bambari	Draft PGES quasi final disponible	Finalisation du PGES et envoi à la Banque
3	Préparation du PGES-C des sites de Bangui et Sibut	Dès le recrutement des entreprises/ draft disponible	En attente de recrutement des entreprises
4	Elaboration des clauses environnementales et sociales	Clauses environnementales et sociales disponibles	En attente du DAO de recrutement des entreprises
5	Renforcement des capacités des parties prenantes sur les mesures de gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux dans les 4préfectures de la premières phases	Activités réalisées	Programmer le renforcement des capacités des préfecture de la phase 2
6	Préparation du PGDBM	Activités en cours	Finaliser au plus tard fin février

3.3.2. Situation des violences basées sur le genre (VBG)

Au 31 décembre 2023, les activités de VBG/EAS et HS du Projet Maïngo se résument par les réalisations suivantes :

N°	Activités planifiées en 2023	Réalisations au 31/12/ 2023	Perspectives 2024
1	Opérationnalisation des Codes de conduite, signatures, formations, sensibilisations et diffusion	Au 31/12/2023, 51 signatures ont été enregistrées dont 16 femmes, 312 personnes sensibilisées sur le contenu du code de conduite dont 117 femmes	Poursuite de l'opérationnalisation du code de conduite, 1000 signatures des acteurs attendues, organisation de 10 séances de formations et sensibilisations pour 1500 cibles. Affichage du contenu des codes de conduite

2	Opérationnalisation du Mécanisme de gestion des plaintes spécifiques aux cas de VBG, EAS et HS	Elaboration du manuel de gestion de plaintes VBG_EAS et HS (disponible) Mise en place points focaux VBG: 13 (Sibut, Dekoa, Mala, Begoua, Bimbo, Mboko, Cité Elevage, Ouango-Sao, Bambari, Grimari, Kaga-Bandoro) Formation et dotation en kits de 6 points focaux Vulgarisation et communication autour du MGP sensible aux VBG_EAS et HS: 05 séances organisées pour 306 cibles touchées dont 113	Mise en place de points focaux et identification d'autres canaux de signalements dans les zones des phases 1 et 2 Organisation de 07 séances de vulgarisation du MGP_VBG, Formation et dotation en kits de 25 points focaux Appui aux personnes survivantes de VBG_EAS et HS
3	Formations et sensibilisations des acteurs et communautés sur la prévention des risques VBG_EAS et HS	06 formations réalisées touchant 312 cibles dont 117 femmes	Formation de 1000 cibles (équipes des travailleurs, du personnel de supervision, des ONG, des ASC, des mentors, des autorités locales, membres de la communauté sur la prévention des risques VBG, EAS/HS) (12 sessions)
4	Elaboration et mise à jour de la Cartographie des services de prise en charge holistique des personnes survivantes	03 cartographies digitalisées des services VBG élaborés à Sibut, Dekoa et Grimari, Circuit de référencement des services VBG dans douze localités des phases 1 et 2 disponible	Elaboration de la cartographie digitalisée des services VBG/EAS/HS dans les zones du projet (Bossangoa, Nana-Bakassa, Boguila, Bozoum, Bocaranga, Ngoundaye, Bamingui, Bakala, Ippy, Ndjoukou, Mala, Kouango)
5	Consultations des bénéficiaires à la base sur les risques EAS et HS	20 groupes de discussions avec les bénéficiaires organisés. Cibles totales touchées 192 dont 96 femmes	Poursuite de consultations communautaires avec les bénéficiaires féminins dans les espaces sûrs, l'impact potentiel du projet et les risques EAS/HS y associés
6	Appui à la célébration des journées statutaires liées aux VBG	Organisation de quatre dialogues facilités (Bimbo, Begoua, Bambari, Kaga-Bandoro et Sibut) sur les droits des femmes et les VBG à l'occasion du 08 mars 2023	RAS
7	Mise à jour du plan d'action pour l'atténuation des risques EAS et HS	Contribution à la Mise à jour des risques EAS et HS en fonction de la restructuration du projet intégrant une nouvelle composante	Suivi de la mise en œuvre du plan
8	Sensibilisations des acteurs et communautés sur la prévention des risques VBG_EAS et HS	08 séances de sensibilisations sur les risques de VBG_EAS et HS organisées ayant touché 533 personnes dont 168 femmes	Poursuite de campagnes de Sensibilisations de 500 bénéficiaires directs, des communautés cibles, des autorités, des leaders communautaires sur les risques d'EAS/HS et sur les biens fondés et avantages des Espaces Surs, bourses, subventions...

3.4 Suivi des activités

Au cours de l'année 2023, les activités de suivi se sont focalisées beaucoup plus sur des missions de terrain, de réunion de comité de pilotage et de supervision de la Banque Mondiale. Il s'agit de :

- Mission d'appui de la mise en œuvre du projet par la Banque mondiale du 08 au 12 mai 2023 à Bangui ;
- Mission d'appui de la mise en œuvre du projet par la Banque mondiale du 09 au 13 octobre 2023 à Bangui ;
- Réunion de comité de pilotage tenue le février 2023 ;

- Suivi de la mise en œuvre des activités des Espaces Sûrs et Clubs dans les zones de la phase 1 du projet ;
- Mission de collecte de la liste des bénéficiaires de bourses et subventions dans les zones de la phase 1 du projet ;
- Réunions bihebdomadaires de suivi de la mise en œuvre du projet avec la Banque mondiale se font régulièrement. Ces réunions ont permis de passer en revue la feuille de route de l'UGP. C'est l'occasion pour l'UGP de présenter l'état d'avancement des activités et les difficultés rencontrées afin que la Banque puisse donner les orientations nécessaires.

A l'issue de ces différentes missions d'appui à la mise en œuvre organisées par la Banque Mondiale, des recommandations fortes ont été formulées à l'endroit de la Coordination Maïngo en vue d'accélérer le rythme de réalisation des activités pour augmenter le taux de décaissement.

IV. ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

3.1. Rappel du programme d'activités (PTBA 2023)

Le détail de ce programme d'activités pour l'exercice 2023 est résumé par composante et sous-composantes dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : PTBA 2023

N°	Composantes/Sous composantes	Cout global du projet	Prévision Budget 2023	
			Montant prévu	Taux
1	CREATION DES ESPACES SURS ET CLUBS	11 814 000 000	2 215 232 400	18,75
1.1	Création des Espaces Sûrs pour les filles et Clubs pour les garçons	6 222 000 000	2 215 232 400	35,60
1.2	Inclusion productive	5 692 000 000	0	0
2	ACCROITRE L'ACCES A LA SANTE, L'EDUCATION ET OPPORTUNITES D'EMPLOI	11 277 000 000	2 018 067 118	17,90
2.1	Elargir l'accès au système de santé grâce aux ASC	5 370 000 00	721 589 554	13,44
2.2	Accueillir et garder les filles dans le système éducatif	3 759 000 000	403 038 544	10,72
2.3	Formation professionnelle et opportunités économiques pour les jeunes non scolarisés dans les CFPA	2 148 000 000	893 439 120	41,59
3	RENFORCEMENT DES CAPACITES ET CAMPAGNES DE COMMUNICATION	3 759 000 000	2 452 837 339	65,25
3.1	Renforcement des capacités nationales	537 000 000	275 981 484	51,39
3.2	Campagnes nationales de communication en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles	537 000 000	180 432 000	33,60
3.3	Gestion du projet, supervision et suivi et évaluation	2 685 000 000	1 996 423 855	74,35
4	REPONSE A DES SITUATIONS D'URGENCE	0	0	0,00
	Total général	26 850 000 000	6 686 136 857	24,90

3.2. Exécution financière du projet au 31 décembre 2023

L'exécution financière du projet est de **1 663 122 397 FCFA** sur un disponible en ressources **26 850 000 000 FCFA** au cours de 1 USD = 537 F CFA ; soit un taux de décaissement d'exécution financière globale de **6,19%** au 31 décembre 2023.

L'exécution financière globale au 31 décembre 2023 du projet est présentée par composantes et par catégories dans le tableau ci-dessous.


Tableau 3 : Exécution financière globale du projet

	Budget total du Projet En FCFA	Réalisations cumulées au 31/12/2023	Taux d'exécution
Emploi par Composante			
Composante 1 : Création des Espaces Sûrs et Clubs	11 814 000 000	343 513 367	2,91%
Composante 2 : Accès à la Santé, l'Education et aux opportunités d'emploi	11 277 000 000	162 894 093	1,44%
Composante 3 : Renforcement des capacités et campagnes de communication	3 759 000 000	1 156 714 937	30,77%
Composante 4 : Réponse aux urgences	0	0	0,00%
Total par Composante	26 850 000 000	1 663 122 397	6,19%
Emploi par Catégorie			
Catégorie 1 : Biens, travaux, services non consultants et services de consultants	26 850 000 000	0	0%
Catégorie 2 : Financement PPA	0	0	0,00%
Catégorie 3 : Dépenses d'urgence au titre de la composante 4	0	0	0,00%
Total par Catégorie	26 850 000 000	0	6,19%

Tableau 4 : Evolution du taux d'exécution financière du projet au cours de quatre (4) trimestres de l'année 2023

	Taux d'exécution T1	Taux d'exécution T2	Taux d'exécution T3	Taux d'exécution T4
Emploi par Composante				
Composante 1 : Création des Espaces Sûrs et Clubs	1,08%	2,11%	1,34%	34,64%
Composante 2 : Accès à la Santé, l'Education et les opportunités d'emploi	14,16%	1,02%	3,70%	6,69%
Composante 3 : Renforcement des Capacités et Campagnes de Communication	19,61%	0,33%	20,80%	17,42%
Composante 4 : Réponse aux urgences	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total par Composante	11,84%	11,04%	9,33%	20,17%
Emploi par Catégorie				
Catégorie 1 : Biens, travaux, services non consultants et services de consultants	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Catégorie 2 : Financement PPA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Catégorie 3 : Dépenses d'urgence au titre de la composante 4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total par Catégorie	0%	0%	0%	

Graphique 1 : Evolution du taux d'exécution financière du projet en 2023

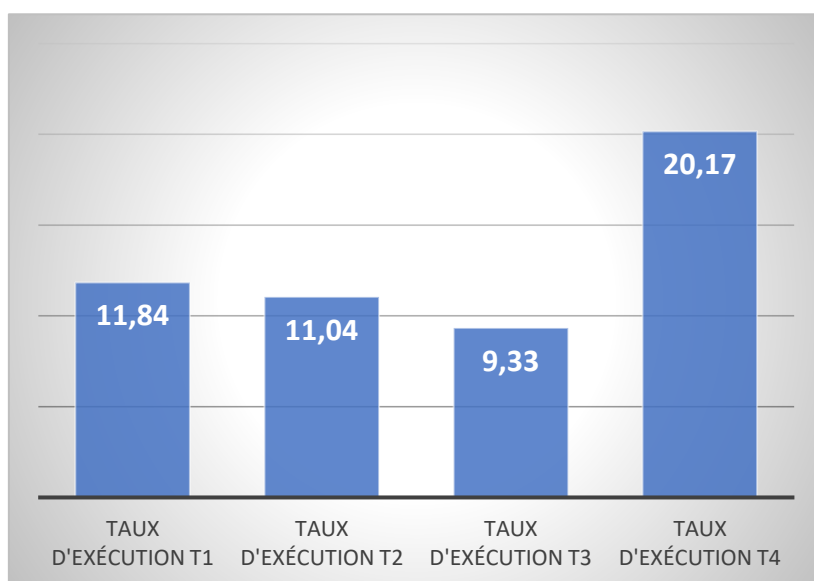

Le graphique montre une progression en termes de décaissement sur l'ensemble de la période considérée. Les décaissements au cours du 4^{ème} trimestre s'établissent à 20,17% soit une augmentation du double du 3^{ème} trimestre. Cette performance

s'explique par le paiement de la facture du consortium CPADES/KODE TI KWA chargé de réaliser les espaces sûrs.

V. PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET SOLUTIONS

5.1 Problèmes majeurs rencontrés

La mise en œuvre du projet Maïngo en 2023 a été moyennement satisfaisante. Cependant, quelques difficultés ont impacté la mise en œuvre du projet. Il s'agit de :

A. Gestion financière :

- **Les difficultés dans le paiement par transfert des fournisseurs et prestataires étrangers cas du consortium CPADES/KTK chargé de la création des espaces sûrs et clubs.**

B. Passation des marchés :

Les difficultés rencontrées en termes de passation des marchés sont entre et autres :

- La maîtrise partielle de la plateforme STEP surtout pour les marchés « A PRIORI » ce qui a fait qu'à ce jour le contrat relatif au « Recrutement d'un consultant (ONG) chargé de la mise en œuvre des activités des espaces sûrs pour les jeunes femmes et clubs pour les jeunes hommes du projet « Maïngo » n'est pas encore signé sur le système ;
- Le marché relatif au « Recrutement d'un Cabinet pour réaliser la conception et la réalisation d'une évaluation d'impact de base et finale pour le renforcement du capital humain des adolescents en République Centrafricaine » dont la négociation avec le Cabinet NORC n'a pas abouti du fait que le Cabinet a estimé que le prévisionnel de la mission est insuffisante ;
- Le retard dans la finalisation de certaines études dû également au retard dans l'élaboration des drafts des Tdrs par certains responsables des composantes.

5.2 Mesures correctives prises et solutions proposées

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En conclusion, l'année 2023 a été marquée par la restructuration du projet en vue d'affecter la somme 30 millions USD pour le paiement des salaires des fonctionnaires centrafricains. Il est à noter que le taux d'exécution physique reste faible (**6,19%**) du fait de retard enregistré dans le recrutement de la 1^{ère} ONG chargée de la mise en place des espaces sûrs et clubs. Il est à noter que la composante 1 représente 40% du budget total du projet.

En perspectives, le recrutement de la seconde ONG en charge de création des espaces sûrs et clubs dans les autres zones du projet de la phase 1 & 2 pourrait améliorer le taux de décaissement. Quant aux retards constatés dans la mise en œuvre de certaines activités telles que : (i) l'étude d'impact du projet ; (ii) la réhabilitation des six (6) CFPA ; et (iii) le recrutement de la 2nde ONG pour la mise en place des espaces sûrs et clubs, la mise à disposition d'une expertise internationale en passation de marchés pour appuyer l'UGP pourra faire avancer les activités sus mentionnées.

ANNEXE

Annexe 1 : Plan de Travail Annuel 2024

Annexe 2 : Cadre de suivi des indicateurs des résultats du projet Maïngo actualisé au 31 décembre 2023

Indicateurs de résultats	Unités de mesure	Base de référence 2021	Valeurs cibles cumulées					Collecte de données			Commentaires / explications
			Déc. 2022		Déc. 2023		avr-26	Fréquence	Sources de données	Responsabilités	
			Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	CIBLE FINALE				
Indicateurs de l'objectif de développement de projet (AOP)											
Changement positif dans les attitudes en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles chez les jeunes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	50,00	Trimestrielle	Enquêtes auprès des bénéficiaires	UGP et Ministère de la Femme	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités
Nouveaux utilisateurs d'une méthode contraceptive moderne	Nombre	0,00	0,00	0,00	3 000	0,00	25 000	Trimestrielle	Système de Gestion Sanitaire Informatisé des établissements (SGSI) / SGSI communautaire	UGP et Ministère de la Santé	L'atteinte de la cible tributaire de l'intervention du projet dans les zones d'intervention.
Indice de parité entre les sexes en première année du premier cycle du secondaire	Pourcentage	59,00	59,00	0,00	63,00	0,00	76,00	Annuelle	Système d'information sur la gestion de l'éducation	UGP et Direction SIGE au MEPS	L'atteinte de la cible tributaire de l'intervention du projet dans les zones d'intervention.
Part des jeunes femmes ayant une activité économique active à la fin de l'accompagnement post-crédation	Pourcentage	0	0	0	33,00	0	50,00	Semestrielle	Rapports d'avancement du projet	UGP Maïngo	L'atteinte de la cible tributaire de l'intervention du projet dans les zones d'intervention.

Annexe 3 : Cadre de suivi des indicateurs intermédiaires actualisé au 31 décembre 2023

Indicateurs de résultats	Unités de mesure	Base de référence 2021	Valeurs cibles cumulées					Collecte de données			Commentaires / explications
			Déc. 2022		Déc. 2023		avr-26	Fréquence	Sources de données	Responsabilités	
			Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	CIBLE FINALE				
Indicateurs de résultats intermédiaires par Composante											
Composante 1 : Créer des espaces sûrs et clubs pour dispenser des programmes intégrés communautaires											
Espaces sûrs et clubs opérationnels : (i) sensibilisés par la communauté, (ii) mentor formé, (iii) bénéficiaires inscrits	Nombre	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	1512,00	Trimestriel	Rapport d'avancement du projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Espaces sûrs pour les jeunes femmes	Nombre	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	756,00				
Clubs pour jeunes hommes	Nombre	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	756,00				
Jeunes qui terminent des programmes de base (compétences de vie, éducation à la santé basée sur les compétences de vie, compétences de base)	Nombre	0,00	0,00	0,00	53 280	0,00	432 540	Trimestriel	Dossiers de projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Jeunes femmes	Nombre	0,00	0,00	0,00	35 520	0,00	288 360				
Jeunes hommes	Nombre	0,00	0,00	0,00	17 760	0,00	144 180				
Jeunes ayant reçu la première tranche de subventions en espèces pour démarrer une activité génératrice de revenus (Nombre)	Nombre	0,00	0,00	0,00	2 362	0,00	19 259	Trimestriel	Dossiers de projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Jeunes femmes	Nombre	0,00	0,00	0,00	2 076	0,00	16 852				
Jeunes hommes	Nombre	0,00	0,00	0,00	297	0,00	2 047				
Jeunes ayant reçu la première tranche et la deuxième tranche de la subvention en espèces	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00	Trimestriel	Rapport d'avancement du projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Jeunes femmes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00				
Jeunes hommes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00				

Les garderies communautaires sont opérationnelles : mises en place par le tuteur, ont des horaires d'ouverture, accueillent les enfants	Nombre	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	378,00	Trimestriel	Dossiers de projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Composante 2 : Accroître l'accès au système permettant d'améliorer la santé, l'éducation et les opportunités d'emploi											
ASC formés pour fournir des services intégrés	Nombre	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	724,00	Trimestriel	Dossiers de projet	MSP/UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Orientations faites par l'ASC vers un établissement de santé	Nombre	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	84000,00	Trimestriel	Rapport d'avancement du projet	MSP/UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Pour les femmes prêtes à accoucher	Nombre	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	34000,00				
Pour que les femmes en âge de procréer reçoivent les conseil de planification familiale	Nombre	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	50000,00				
Survivantes de violences sexuelles référées et arrivant dans un centre de traitement dans les 72 heures	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	75,00	Trimestriel	Rapport d'avancement du projet	MSP/UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Personnes ayant reçu des services essentiels de santé, de nutrition et de population (SNP)	Nombre	0,00	0,00	0,00	35.520,00	0,00	288.360,00				L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Personnes ayant reçu des services essentiels de santé, de nutrition et de population (SNP) - Femmes (exigence RMS)	CRI, Nombre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Nombre d'enfants vaccinés	CRI, Nombre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Nombre de femmes et d'enfants ayant reçu des services nutritionnels de base	CRI, Nombre	0,00	0,00	0,00	35.520,00	0,00	288.360,00				
Nombre d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié	CRI, Nombre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programme « Rendre l'école accessible aux filles » opérationnel : (i) ciblage achevé, (ii) des mécanismes de suivi mis en place, (iii) options de paiement organisées	Oui/Non	Non	oui	0,00	oui	0,00	oui	Annuel	Rapport d'avancement du projet	UGP et Direction de l'enseignement primaire et secondaire au MEPS	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.

Bourses d'études pour les étudiants passant en première année du premier cycle du secondaire (5ème)	Nombre	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	17.311,00	Annuel	Rapports réguliers au niveau des IA corroborés avec ceux de l'UGP	Direction de l'Education Primaire et Secondaire au MEPS en collaboration avec les IA respectives et le soutien de la UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Filles	Nombre	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	15.053,00				
Garçons	Nombre	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	2.258,00				
Bourses aux étudiants séjournant dans les écoles du premier cycle du secondaire	Nombre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	Direction de l'Education Primaire et Secondaire au MEPS en collaboration avec les IA respectives et le soutien de la UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Filles	Nombre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,00				
Garçons	Nombre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00				
Paiement des frais de scolarité pour les élèves inscrits du CM1 à la 6ème	Nombre	0,00	0,00	0,00	8.883,00	0,00	102.729,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	Direction de l'Education Primaire et Secondaire au MEPS en collaboration avec les IA respectives et le soutien de la UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Filles	Nombre	0,00	0,00	0,00	7.724,00	0,00	89.330,00				
Garçons	Nombre	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	13.399,00				
Visites scolaires ad hoc annuelles effectuées pour vérifier la présence des boursiers dans les écoles	Nombre	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	12,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	Direction de l'Education Primaire et Secondaire au MEPS en collaboration avec les IA respectives et le soutien de la UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Filles touchées par le biais d'espaces surs en milieu scolaire	Nombre	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	60.288,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	Direction de l'Education Primaire et Secondaire au MEPS en collaboration avec les IA respectives et le soutien de la UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.

Élèves participant à des séances de discussion sur le genre et la santé	Nombre	0,00	0,00	0,00	13.134,00	0,00	108.198,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP et Direction de l'enseignement primaire et secondaire au MEPS	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Écoles dotées d'un comité de gestion scolaire établissements qui ont reçu des subventions scolaires qui se traduisent par des activités favorables aux filles	Nombre	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	429,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP et Direction de l'enseignement primaire et secondaire au MEPS	Les écoles de F1 et F2 dans Grand Bangui santé dotées COGEDES/AME
École secondaire	Nombre	0,00	0,00	0,00	21,00	5,00	54,00				Cible partiellement atteinte au 31 déc 2023
École primaire	Nombre	0,00	0,00	0,00	98,00	20,00	375,00				Cible partiellement atteinte au 31 déc 2023
Jeunes ayant suivi des programmes de formation professionnelle dans les CEFPA	Nombre	0,00	0,00	0,00	1.650	0,00	11.000,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP et Direction des CEFPA au MEPS	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Jeunes femmes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	5.500,00				
Jeunes hommes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	5.500,00				
Jeunes ayant reçu la première tranche de subvention en espèces pour démarrer une activité génératrice de revenus	Nombre	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	3.500,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP et Direction des CEFPA au MEPS	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Jeunes femmes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	1.751,00				
Jeunes hommes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	1.749,00				
Jeunes ayant reçu la première tranche et la deuxième tranche de la subvention en espèces dans les CEFPA	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00	Trimestriel	Dossiers de projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Jeunes femmes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00				
Jeunes hommes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00				
CEFPA rénovés	Nombre	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP et Direction des CEFPA au MEPS	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.

CEFPA avec des comités de gestion établis qui reçoivent des subventions scolaires qui se traduisent par des activités amies des filles	Nombre	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP et Direction des CEFPA au MEPS	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Bourses aux étudiants fréquentant les CEFPA (Nombre)	Nombre	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	2.100,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP et Direction des CEFPA au MEPS	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Jeunes femmes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	1.750,00				
Jeunes hommes	Pourcentage	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	350,00				
Composante 3 : Campagne d'information nationale pour l'autonomisation des femmes et des filles											
Évaluation d'impact terminée	Oui/Non	Non	Non	Non	Non		Oui	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP	L'atteinte de la cible est tributaire du recrutement du bureau d'étude
Référence terminée	Oui/Non	Non	Non	Non	Oui		Oui				
Fin de ligne complétée	Oui/Non	Non	Non	Non	Non		Oui				
Observatoire du capital humain fonctionnel : nombre de réunions convoquées chaque année	Nombre	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	4,00	Annuel	Rapports d'avancement du projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Fonctionnaires gouvernementaux participant à des événements d'apprentissage et de partage des connaissances au niveau régional	Nombre	0,00	5,00	0,00	10,00	11,00	25,00	Trimestriel	Rapports d'avancement du projet	UGP	Cible atteinte - Neuf (9) cadres dont 5 de l'UGP et 4 des ministères sectoriels ont effectué un voyage de partage d'expériences en Côte d'Ivoire - Deux (2) cadres dont 1 de l'UGP et 1 du ministère du Travail ont participé au sommet des Chefs d'Etat sur le Capital Humain en Tanzanie
Test d'audience : qui se souvient avoir vu ou entendu un message spécifique lié à la campagne ?	Pourcentage	0,00	10,00	0,00	15,00	0,00	30,00	Annuel	Enquête rapide	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
Plaintes traitées dans le délai spécifié dans le MEP du projet	Pourcentage	0,00	85,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Trimestriel	Rapports d'avancement du projet	UGP	L'atteinte de la cible est subordonnée à la réalisation des activités.
